
IMPLANTATION SP1 CHERRAT - MISE A JOUR LEVE TOPO 30/10/2026 (PROPOSITION)

Tirets couleur = implantation theorique (coord. corrigees 27/07/2026) ; rouge = leve Nouamane 30/10/2026 ; magenta = vecteur d'ecart x 20 (vrai au-dela de 30 cm) ; bleu = local de chloration (guide G-C 02/11).

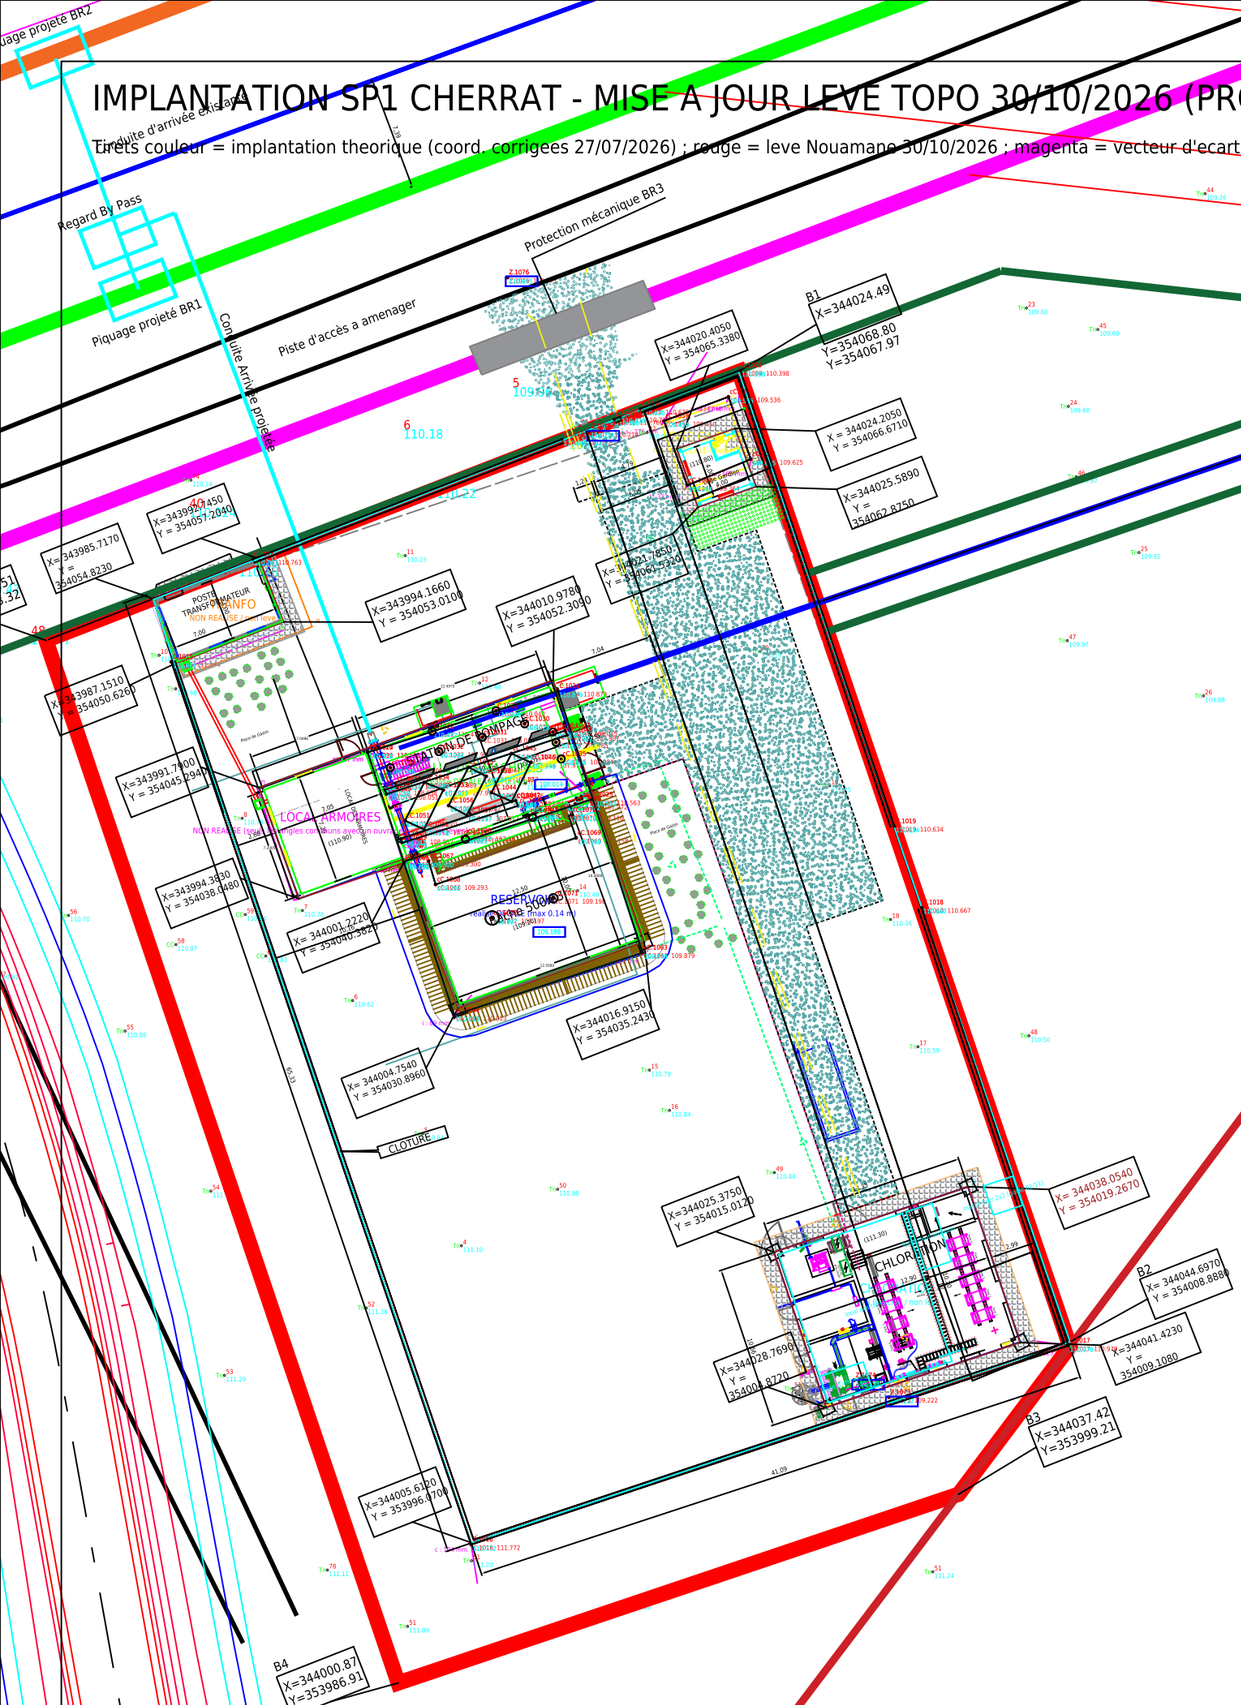

BILAN PAR OUVRAGE

Chloration : NON REALISE / non leve

reservoir : realise DECALE (max 0.14 m)

Salle des machines : realise DECALE (max 0.14 m)

local armoires : NON REALISE (seuls les angles communs avec un ouvrage voisin sont leves)

Transfo : NON REALISE / non leve

Loge gardien : realise DECALE (max 0.50 m)

Clotures : realise DECALE (max 2.05 m) - 3/4 sommets leves

CONSTATS

Cloture, sommet w : Y theorique 354 070,455 identique a celui du coin v de la loge (copie ?) ; angle leve C.1009 = (344023.178 ; 354072.501), soit 2.05 m de w. Verifier w dans l'Indice E.

Cloture ouest levee C.1015 -> C.1016 : le coin theorique q (= coin du poste transfo) est a 0.19 m de cette ligne mais a 4.21 m de C.1015 ; l'angle nord-ouest est realise en pan coupe C.1015 -> C.1014 au lieu de l'angle q.

Cloture nord, troncons leves : C.1009-C.1010 7.01 m ; C.1010-C.1011 1.37 m ; C.1011-C.1012 0.44 m ; C.1012-C.1013 3.64 m ; C.1013-C.1014 21.64 m ; C.1014-C.1015 8.53 m (les interruptions = portail / portillon / non leves a confirmer).

Cloture est : interruption C.1018 -> C.1019 de 5.59 m (portail ?).

Local de chloration / cloture est realisee (C.1017 -> C.1018), distance a l'axe de la cloture (+ = a l'interieur) : angle SE du local (e) +2.92 m ; angle NE du local (g) +2.93 m ; massif tour, angle SE -0.08 m ; massif tour, angle NE -0.07 m ; bord est de la tour O1 100 +0.38 m (local implante sur d-e-g-h). Le massif 2 000 x 2 000 de la tour (guide 02/11) deborde sur la cloture : a reprendre (massif reduit / decale, tour plus pres du voile).

Salle des machines : 33 points au niveau radier, 107.862 a 108.082 (moyenne 107.993) ; sol fini theorique 108,01 (plan d'equipement Indice F2).

Loge gardien : 4 angles leves a 109.364 - 109.625 (TN theorique 109,89 - 110,15) : niveau des fondations / dallage ? a confirmer.

Point Z.1073 (344032.871 ; 354005.548) cote 109.222.

Point Z.1074 (344030.612 ; 354006.655) cote 109.133.

Point Z.1075 (344013.344 ; 354068.522) cote 110.214.

Point Z.1076 (344007.998 ; 354078.558) cote 110.045.

CFD TRAVAUX - Station de pompage SP1 LGV Cherrat (ONCF / ONEE-BO)

Implantation : controle des ouvrages realises - leve topo Nouamane du 30/10/2026

Coordonnees Lambert (m) - inserer au point 0,0,0 dans l'Indice E

Indice F propose le 02/11/2026 - A VALIDER PAR KHALID - echelle 1/400 (A3)

Genere par outils/sp1_cherrat/maj_implantation_topo_cherrat.py (IMP-1 du 02/11/2026)
